Plan d'évacuation des eaux de chantier (PEE) pour les projets de la construction - DCPE872 (VD)

1) Renseignements généraux sur les travaux

Dispositions légales :
Le maître d'ouvrage (MO) est responsable de la protection des eaux et demeure garant de la conformité des rejets vis-à-vis de la législation en vigueur.
En remettant le présent PEE, le MO et ses mandataires s'engagent à respecter les prescriptions de la directive cantonale relative à la Gestion des eaux de chantier DCPE872 (Lien : Eaux de chantier, Vaud).

Construction concernée :

N° de Parcelle : **1755**

N° CAMAC : **250753**

Nom du projet : **Installation d'une PAC géothermie**

Adresse du bâtiment : **Ch. de la Pale 2 - 1373 Chavornay**

Contacts	1 - Maitre d'ouvrage	2 - Auteur de projet
Entité/Société		**Alpha-Contrôle SA**
Nom, Prénom	**Parata Alessio**	**Morel Eric**
Téléphone	**078/641.72.68**	**021/909.10.60**
E-mail	Parata.alessio@gmail.com	Alpha-controle@bluewin.ch
Adresse	**Ch. de la Pale 2** **1373 Chavornay**	**Ch. des Terrraux 1** **1670 Ursy**

Contacts	3 - Direction de travaux *	4 - Entreprise : personne désignée pour la protection des eaux *
Entité/Société	**Alpha-Contrôle SA**	**TecDrill SA**
Nom, Prénom	**Morel Eric**	**Romain Gouffon**
Téléphone	**021/909.10.60**	**+41 21 905 66 65**
E-mail	Alpha-controley@bluewin.ch	**info(at)tecdrill.ch**
Adresse	**Ch. des Terraux 1** **1670 Ursy**	**Rue du Battoir 26** **CH-1515 Neyruz-sur-Moudon**

* Le présent formulaire complété avec l'ensemble des coordonnées des personnes aux rubriques 3 et 4 est à transmettre à l'autorité communale par le MO (ou délégué) avant le début des travaux.

Informations sur les travaux

Démolition ☐ Transformation ☒

Construction ☐

Surface de la fouille (terrassements) :		m^2
Surface du radier (gros œuvres) :		m^2
Durée du chantier :		Volume approximatif de béton :	m^3

Description succincte des travaux :

Réalisation de forage géothermique pour la pose d'une PAC

2) Gestion des eaux de chantier : récolte, traitement, contrôle et évacuation

Secteurs et zones de protection des eaux : ☒ secteur üb ☐ secteur Au ☐ zones S

Dimensionnement, type de traitement et exutoire des eaux de chantier

Le tableau de la page suivante (annexe 1) doit être **dûment complété** en tenant compte **des travaux entrepris par le MO.**

- En fonction du **dimensionnement des eaux de chantier**, les **dispositifs de traitement** et le **choix des exutoires** sont à déterminer conformément à la DCPE872.
- Les **moyens mis en place par le MO** doivent **garantir** en **tout temps le respect des prescriptions de l'Ordonnance sur la protection des eaux.**

Pour le dimensionnement des eaux de chantier météoriques (ex. eaux de fouilles / lessivages) la formule suivante peut s'appliquer :

Volume eaux de chantier météoriques	=	Surface à considérer*	x	Intensité de pluie**	x	Coefficient de ruissellement**

* Selon les plans du projet (emprises des fouilles / zones lessivées / toute autre zone impactée par le projet)
** **Pour** le **dimensionnement des eaux de chantier météoriques** un **support d'aide** est **disponible** selon **l'accès suivant : Lien : Eaux de chantier, Vaud.**

Surface à considérer (m^2)	Intensité de pluie (mm/j)	Coefficient de ruissellement	Débit d'eaux météoriques (m^3/h) à reporter dans le tableau page suivante

3) Engagements du MO (ou délégué)

Le MO (ou délégué) **confirme avoir :**

- complété le **tableau à la page suivante (annexe 1)** (dimensionnement, type de traitement et exutoire des eaux de chantier) ☒ oui
- adjoint au présent PEE un/des plan(s) illustrant la gestion des eaux de chantier ☒ oui

Le MO (ou délégué) **s'engage à transmettre avant le début des travaux à l'autorité communale une version mise à jour du présent PEE** avec :

- l'ensemble des coordonnées des personnes aux rubriques 3 et 4 (en orange page 1) ☐ oui
- un plan d'urgence pour les événements extraordinaires (adapté avec les personnes de contact) ☒ oui

Signature du maitre d'ouvrage (ou délégué)

Date : **20.07.2026**

Prénom, Nom : **Alpha-Contrôle SA**

Signature(s) :


ALPHA-CONTRÔLE SA
Installation chauffage / sanitaire
Révision de citernes
Chemin des Terraux 1
1670 URSY / tél. 021 909 10 60

Annexe 1 : Dimensionnement, type de traitement et exutoire des eaux de chantier				
Types d'eaux	**Traitement**	**Exutoire**	**Débit max. projeté / à traiter (m^3/h)**	**Commentaire(s)**
Gros-œuvre				
Eaux de fouille **Eaux de lessivage** *(contact avec béton, etc.)*	☐ **Décantation paroi plongeante + neutralisation**	☐ **Eaux usées** ☐ **Infiltration**		
Eaux de lavage (*outils, coffrage, centrale à béton, roues d'engin de chantier…)*		☐ **Recyclage**		
Eaux de forage **Eaux de fraisage** (*eaux de refroidissement)*	☐ **Décantation paroi plongeante + neutralisation** ☐ **Floculation**	Pendant travaux ☒ **Recyclage** Après travaux ☐ **Eaux usées**	3m3/h	*Evacuation dans des bennes étanches 7m3 ou 10m3
Eaux souterraines (non polluées)	☐ **Décantation**	☐ **Infiltration** ☐ **Collecteur Eaux claire** ☐ **Eaux de surface**		
Second-œuvre				
Eaux de lavage		☐ **Recyclage** ☐ **Traitement et évacuation selon les fiches de sécurité des produits**		
Eaux sanitaires				
Lavabo, WC		☐ **Eaux usées** ☐ **WC chimiques**		
Commentaire(s)				

Commentaire(s) (suite)


En annexe : Plan d'évacuation des eaux de chantier et plan d'urgence.

Schéma de principe pour le traitement et l'évacuation des eaux de chantier (extrait de la DCPE 872)

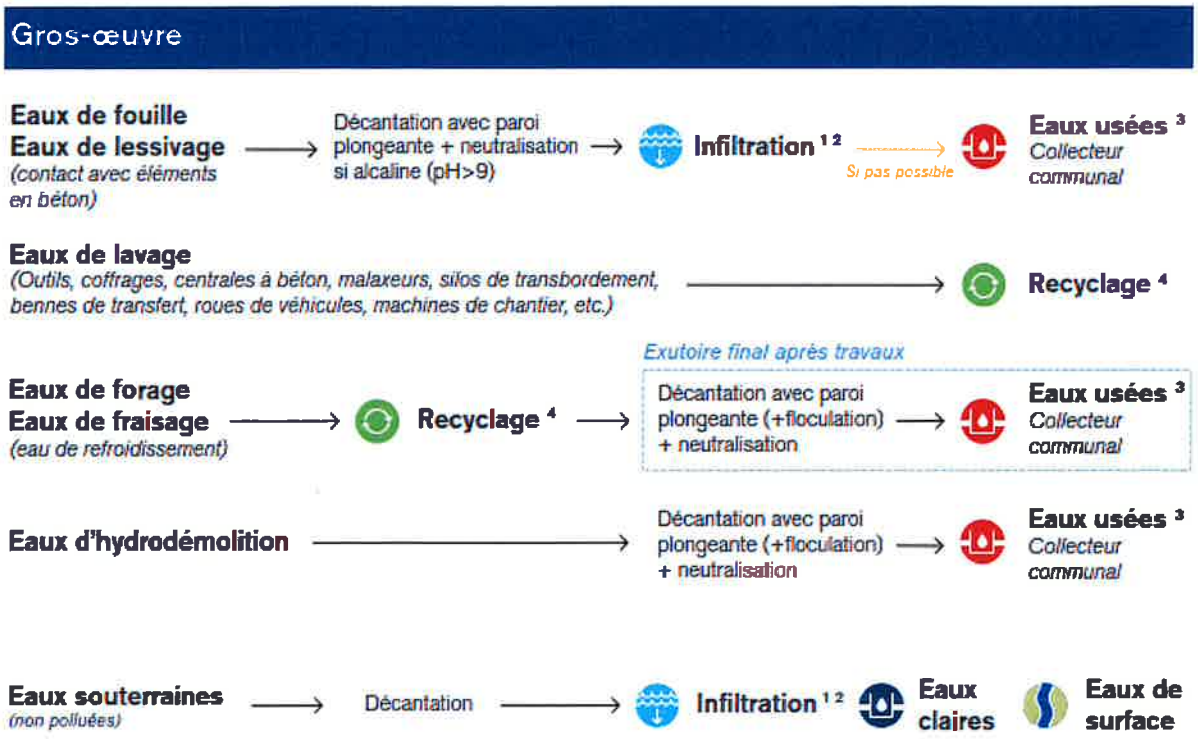







1 cf. schéma 3 illustrant le principe d'infiltration à travers la couche biologiquement active du sol.

2 L'évacuation par infiltration des eaux de fouille, de lessivage et souterraines, après traitement, est soumise à une autorisation spéciale de la part de la Section Eaux souterraines de la DGE dans les secteurs particulièrement menacés (secteurs Au/Ao de protection des eaux et aires d'alimentation Zu).


3 Un préavis favorable de la STEP est nécessaire. Cette dernière fixe les conditions de rejet, peut exiger l'installation d'un compteur d'eau et imposer une taxe de rejet pour les déversements dans les eaux usées.

4 L'autorité compétente peut autoriser exceptionnellement le rejet de ces eaux dans le collecteur des eaux usées (STEP).

TECDRILL
BORN TO DRILL
GÉOTHERMIE & RECHERCHE D'EAU

Plan d'évacuation des eaux de chantier

Remarque: Merci de vous référer à ce plan : nous appliquons systématiquement la même installation sur l'ensemble de nos chantiers.

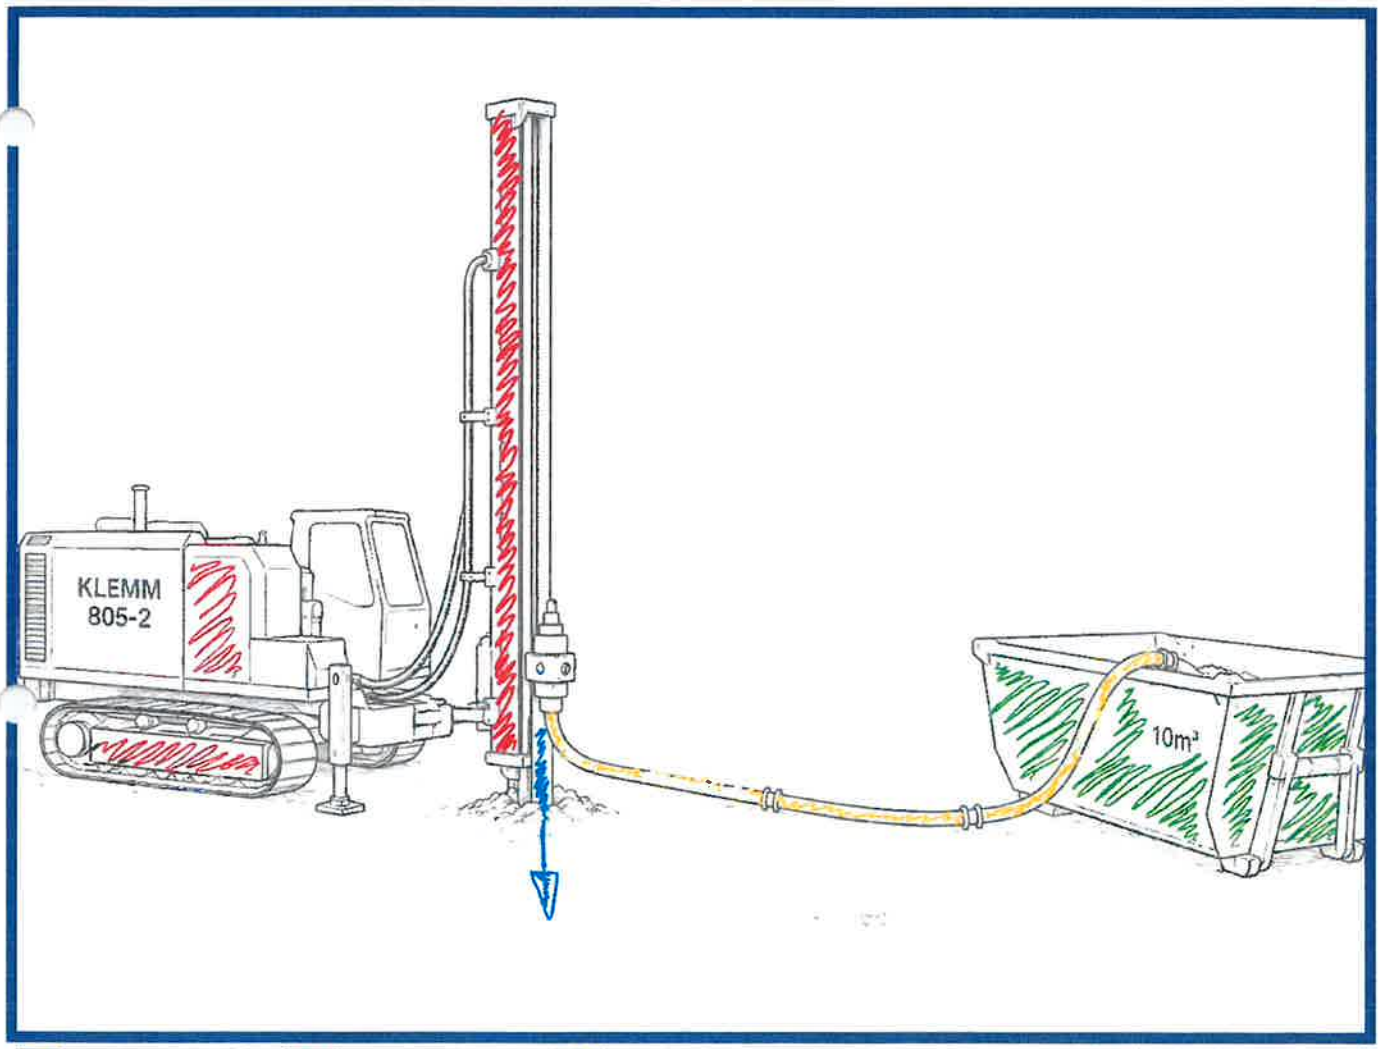

Forage	Engin de forage	Tuyaux évacuation boue	Benne étanche	Autre

Plan d'urgence

Remarque: En cas d'urgence, nous pouvons utiliser des bennes de 40 m³ comme solution tampon.

TecDrill SA (forage)
Rue du Battoir 26
1515 Neyruz-sur-Moudon


Personne de contact par voie hiérarchique:

BUREAU:	+41 21 905 66 65
GOUFFON Romain:	+41 78 256 66 65
MENOUD Simon:	+41 79 709 18 18

Pierre Blanc Transports SA (transport)
Route de Servion 38
1083 Mézières

Personne de contact par voie hiérarchique:

BUREAU:	+41 21 791 53 47
MARINHEIRO Steve:	+41 79 960 44 16
CROTTAZ Jean-Daniel:	+41 79 442 55 03

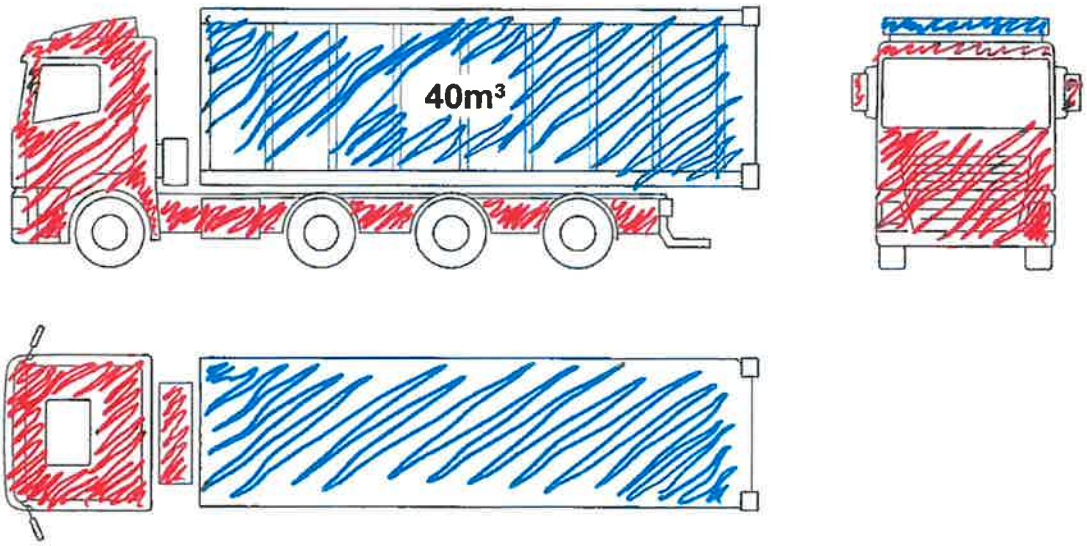

Benne | Engin de transport | Autre
